



LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G



# Vorstellung Bauphasen und Verkehrsführungen

Umbau S10/ B124/ B125 - AST Unterweikersdorf



LAND  
OBERÖSTERREICH

ASFiNAG



# Projektleitung Land OÖ und ASFiNAG

**Land Oberösterreich**

**Abteilung Straßenneubau und –erhaltung**

Gruppenleiter Baumanagement:

DI Erich **Schöfer**

Straßenbezirksleiter und Projektleiter Planung:

Ing. Christian **Pleiner**

Projektleitung Bau:

Ing. Andreas **Gattringer**

**ASFiNAG**

**Baumanagement**

Regionalleiter:

DI Christian **Eckhardt**

Teamleiter:

Dipl.-HTL-Ing. Robert **Schnabl**

Projektleitung Bau:

DI Matthias **Stiftinger**



LAND  
OBERÖSTERREICH **ASFINAG**



# Technische Planung und Örtliche Bauaufsicht für die ASFINAG

**Schimetta Consult Ziviltechniker GmbH**

Projektleiter Straßenplanung:

DI (FH) Markus **Pirngruber**



Projektleiter Brückenplanung:

DI Moritz **Menge**

Projektleiter Stv. Brückenplanung:

DI Dr. Paul **Kugler**

**SPP** SPIRK + Partner Ingenieur GmbH  
SPIRK.AT

ÖBA-Leiter:

DI Harald **Vankat**

ÖBA-Leiter Stellvertreter:

Ing. Jürgen **Geidl**

**Trafility GmbH**

Projektleiter:

DI Hannes **Brenner**





LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G



# Bauleitung Swietelsky AG

## **Straßen- und Leitungsbau:**

Technischer Niederlassungsleiter:

Uwe **Tuma**

Technischer Gruppenleiter:

Harald **Dobusch**

Bauleitung:

Mario **Kitzmüller**

Technikerin:

Anna **Mitter**

Polier:

Gerald **Schachinger**

## **Ingenieur Tiefbau:**

Bereichsleiter:

Peter **Schiller**

Bauleitung:

Johann **Höflinger**

Techniker:

Roland **Steinhuber**

Polier:


Helmut **Erbler**



LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G

# Übersichtskarte

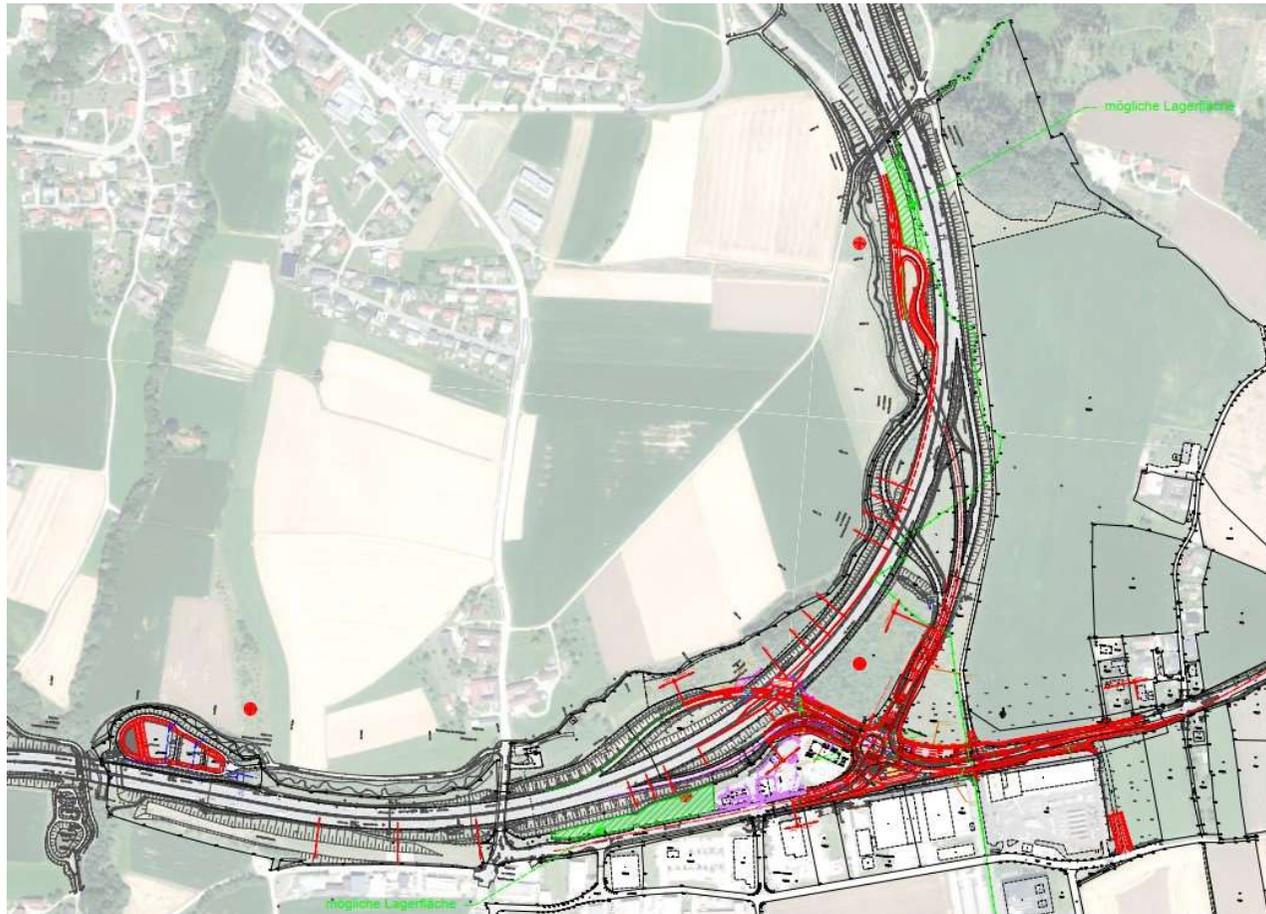





LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G




# Bauphase 00- prov. Rampe





# Bauphase 00- Verkehrsführung S10

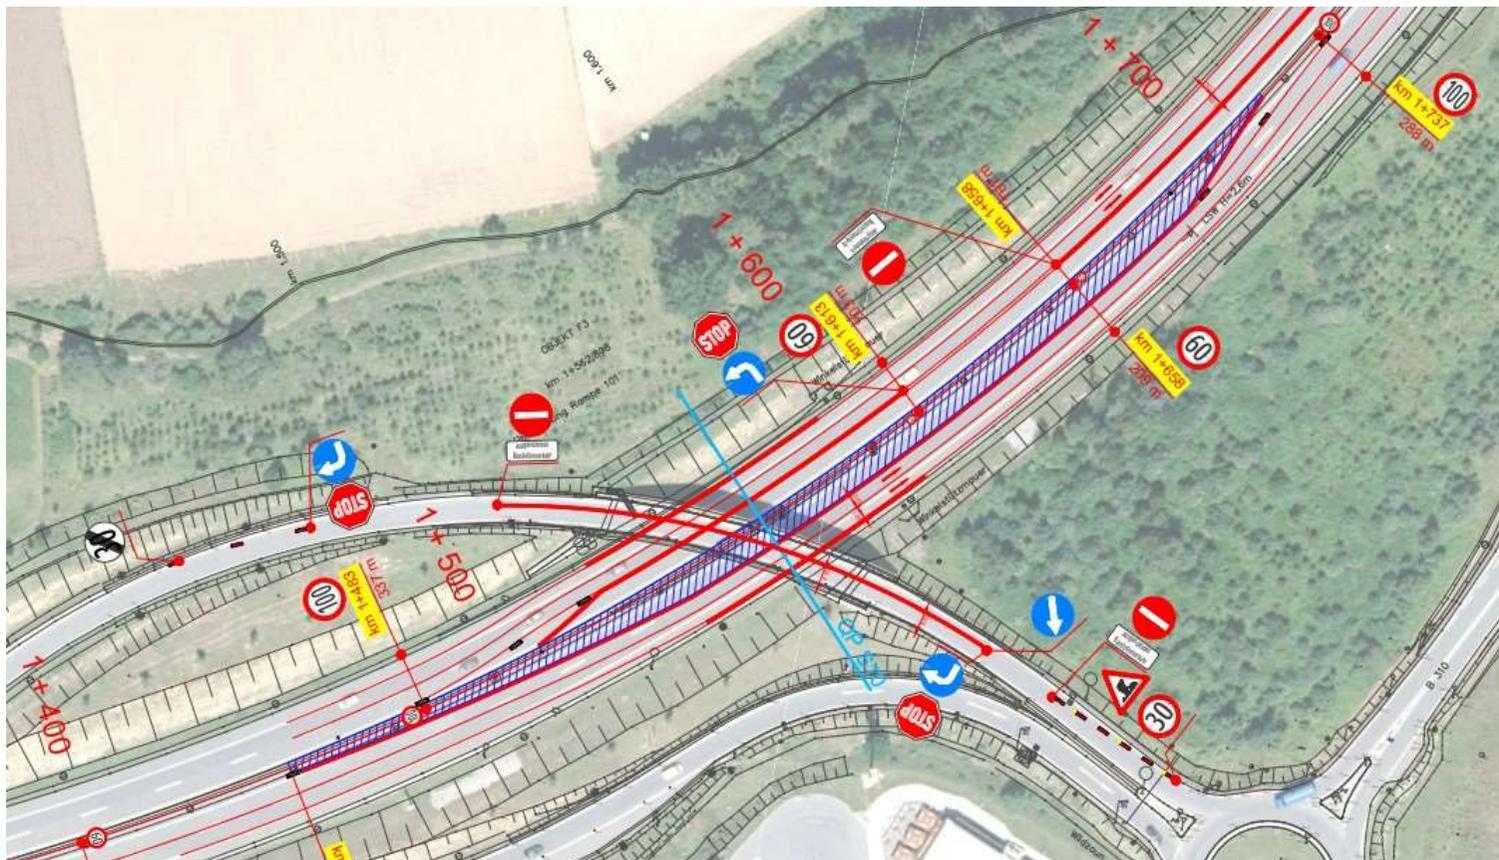






LAND  
OBERÖSTERREICH

ASFiNAG



# Bauphase 01

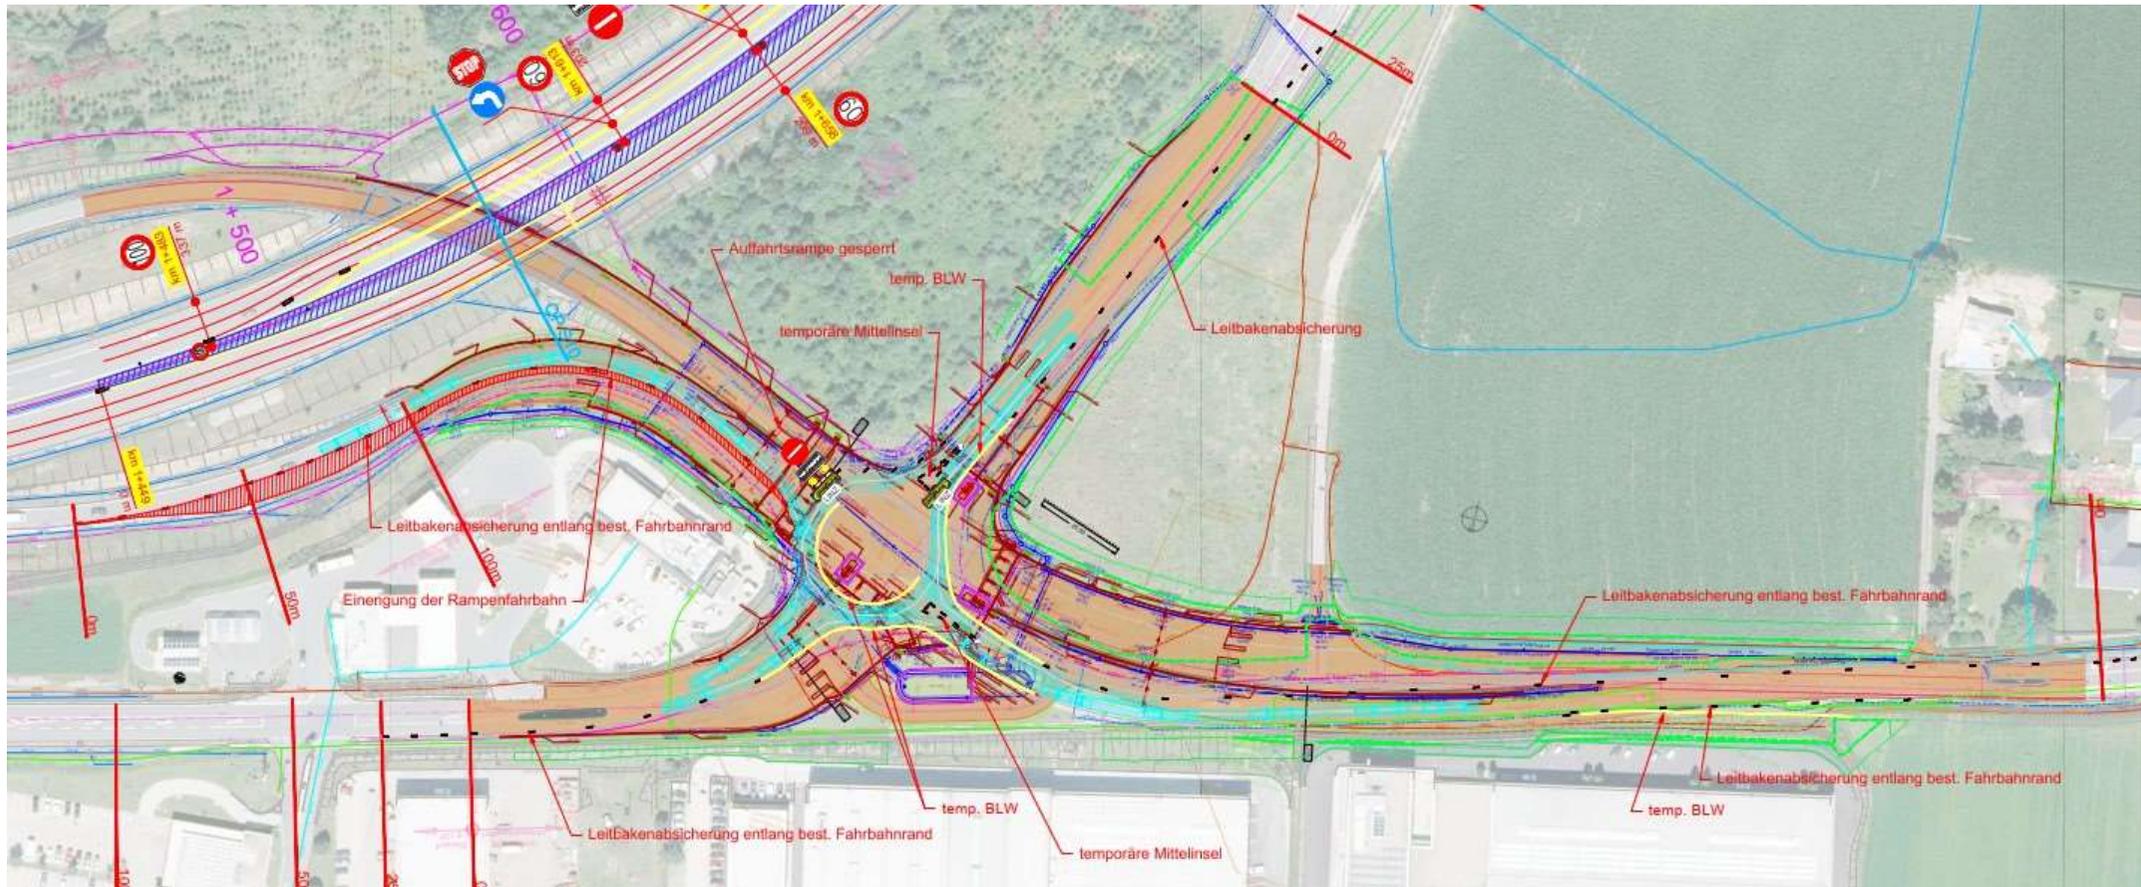




LAND  
OBERÖSTERREICH

ASFINAG



# Bauphase 01

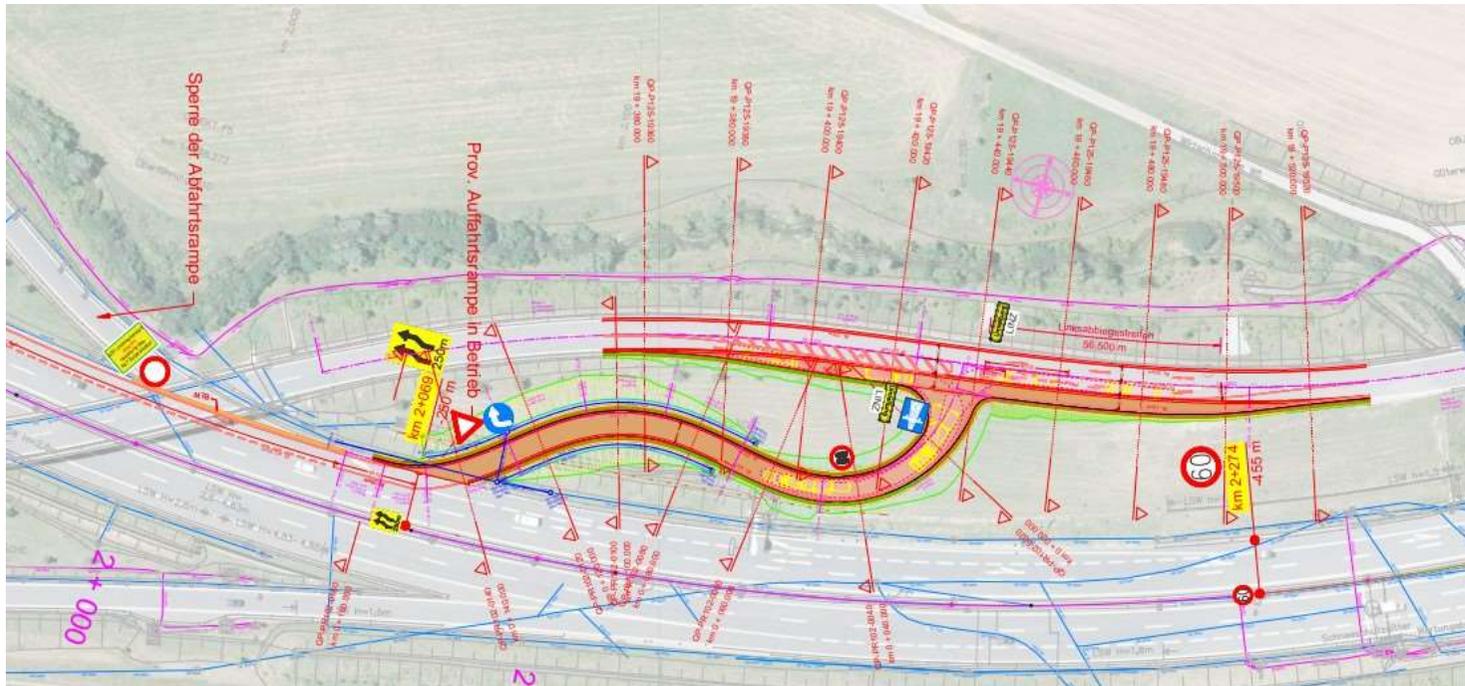

**Bauzeit Bauphase 01:**

**04/2025 – 06/2025**




LAND  
OBERÖSTERREICH

ASFINAG



# Übergang Bauphase 01 auf 02

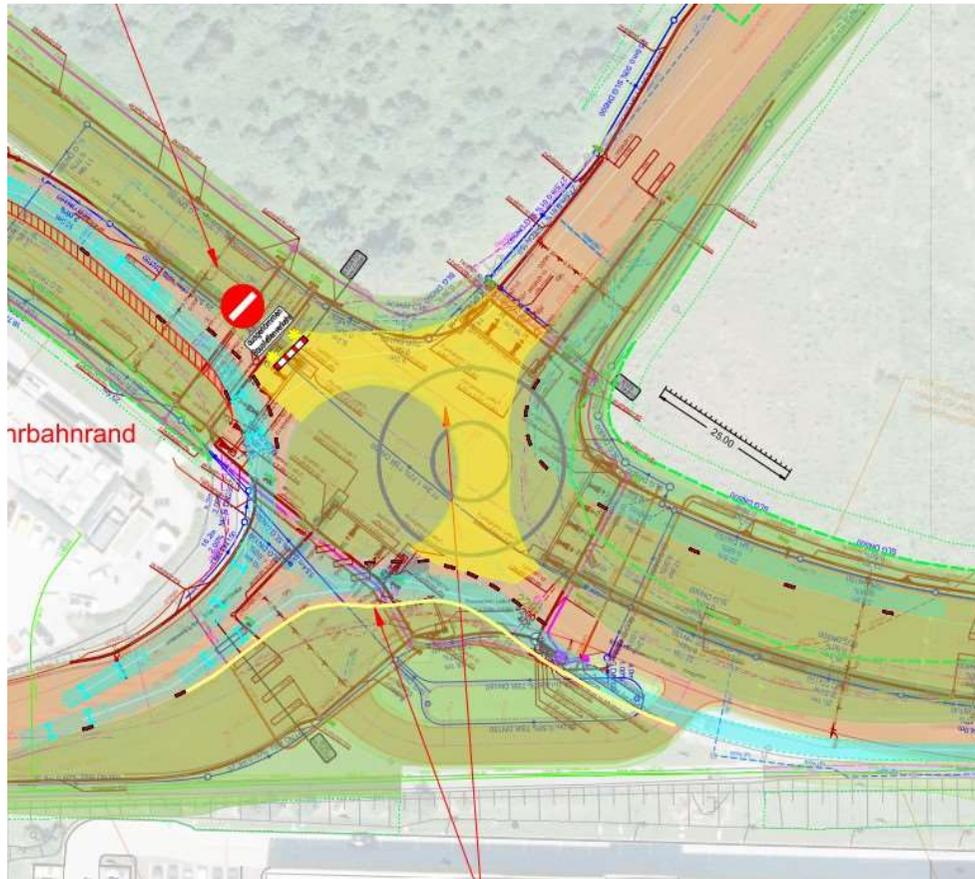


**Bauzeit:**

**06/2025 (1 Wochenende)**



# Übergang Bauphase 01 auf 02

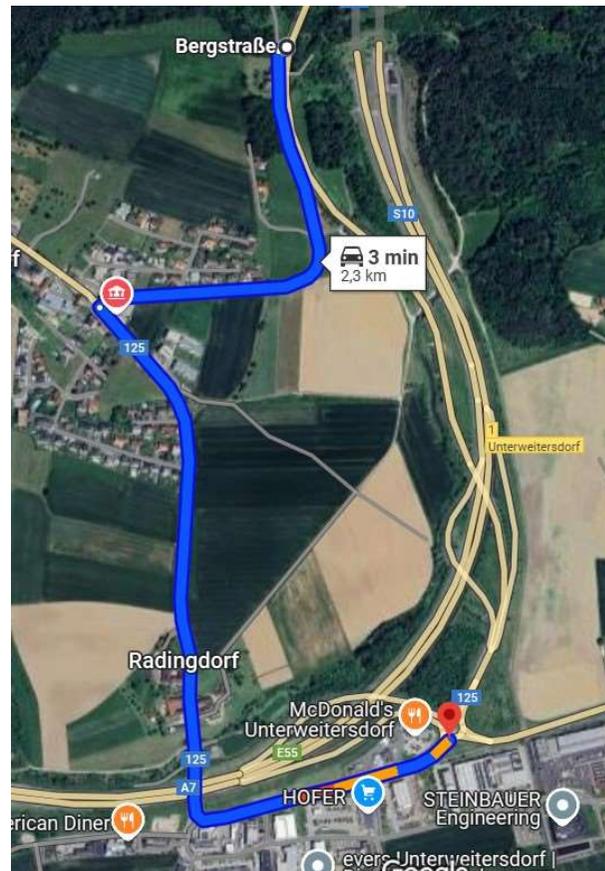




LAND  
OBERÖSTERREICH

ASFINAG



# Bauphase 02

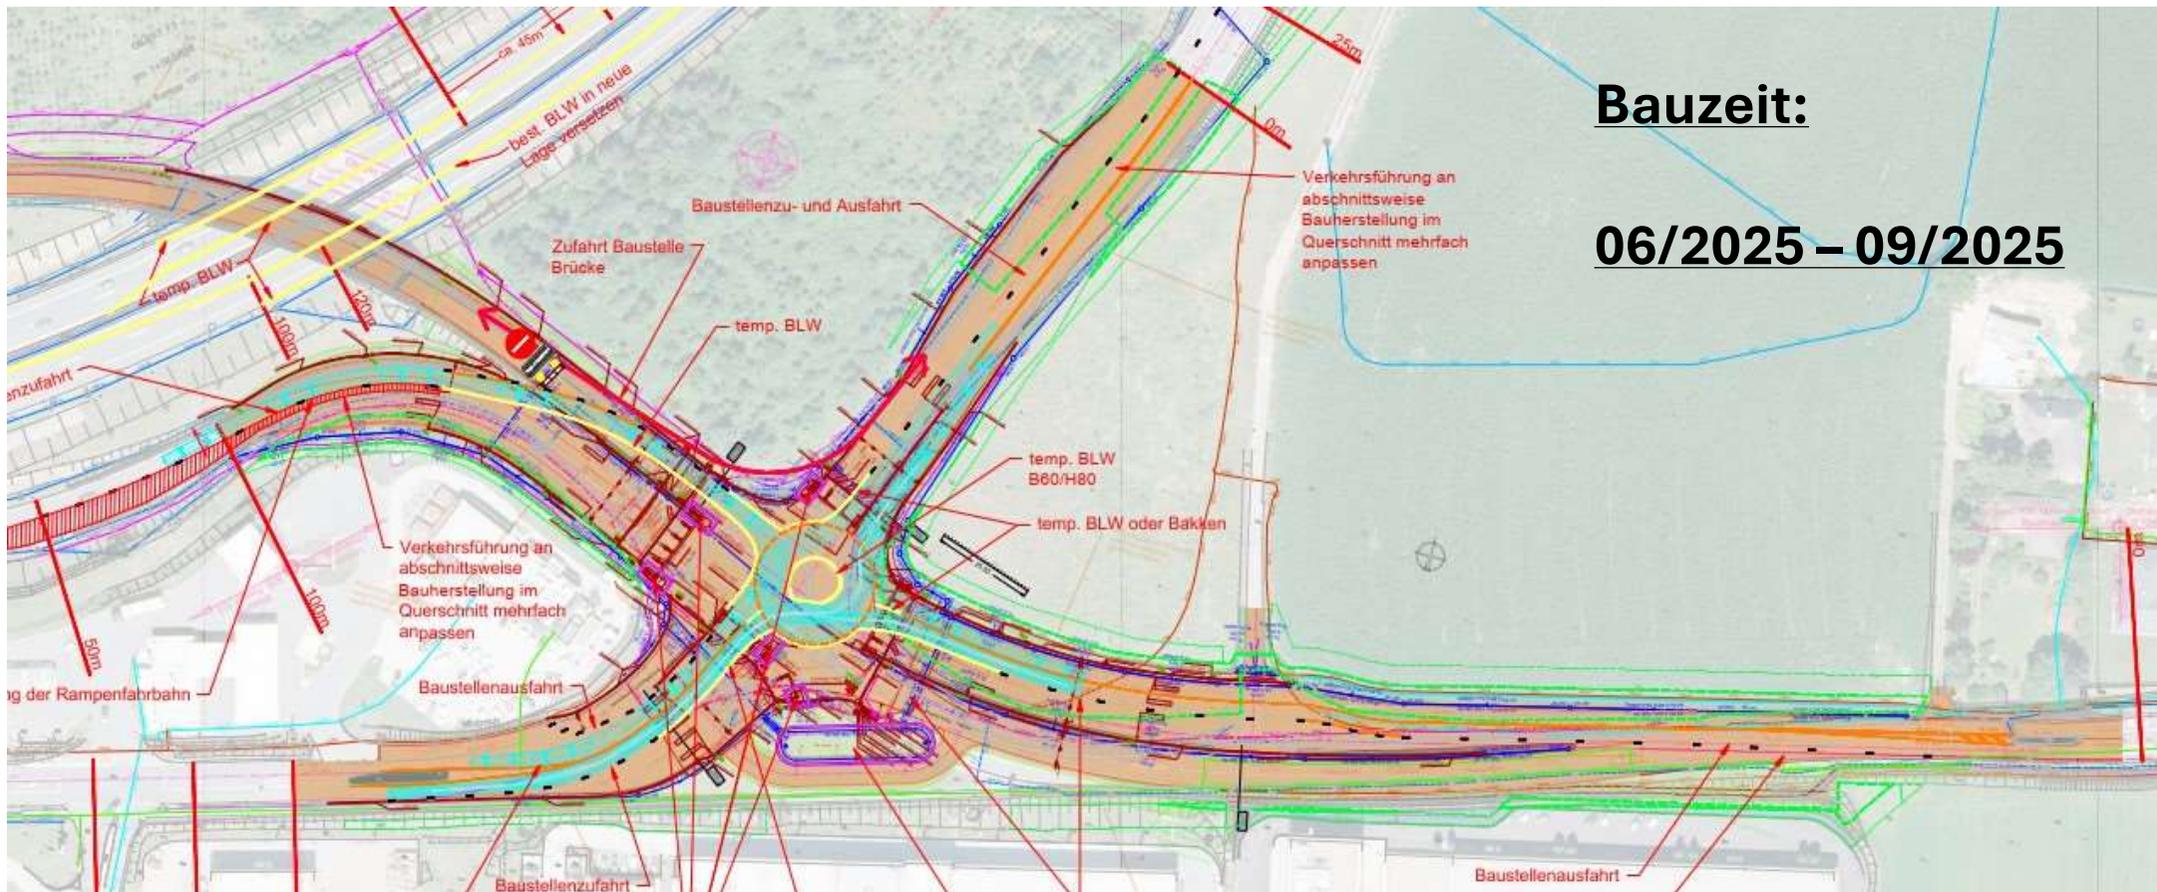



LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G



# Übergang Bauphase 02 auf 03

→ **Verkehrsfreigabe Auffahrtsrampe S10 – RFB Linz am 05.09.2025**

→ **Verkehrsfreigabe Abfahrtsrampe S10 – RFB Linz am 05.09.2025**





LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G



# Bauphase 04

**Bauzeit: 11/2025 – 12/2025**

## **Bautätigkeiten:**

- Herstellen Bodenmarkierungen
- Herstellen Verkehrsleiteinrichtungen
- abschnittsweiser Rückbau der prov. Verkehrsleiteinrichtungen
- Inbetriebnahme und Probebetrieb VLSA
- div. Restarbeiten



LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G



# Ombudsservice

- Um Anfragen zielgerichtet beantworten zu können, wird ein Ombudsservice eingerichtet
- Anfragen werden entweder direkt von der Ombudsperson beantwortet oder an das Projektteam weitergeleitet

## Haben Sie Fragen?

ombudsperson@asfinag.at

+43 50108 99399



LAND  
OBERÖSTERREICH



A|S|F|i|N|A|G



LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G



# Zusammenfassung Bauphasen

## **Bauphase 00 (ca. 03/2025):**

- Vorbereitungsmaßnahmen

## **Bauphase 01 (ca. 04/2025 – 06/2025):**

- Sperre Auf-/ Abfahrtsrampe S10
- Ausbauarbeiten entlang B124/ B125/ Rampen S10
- Beginn Umbauarbeiten Brückenobjekt F3

## **Bauphase 02 (ca. 06/2025 – 09/2025):**

- Verkehrsumlegung im Baufeld
- Ausbauarbeiten entlang B124/ B125/ Rampen S10
- Umbauarbeiten Brückenobjekt F3
- Errichtung Stützobjekt entlang Lagerhaus

## **Bauphase 03 (ca. 09/2025 – 10/2025):**

- Verkehrsfreigabe Auf-/ Abfahrtsrampe S10
- Rückbau Verkehrsführungen S10/ prov. Rampe
- Ausbauarbeiten entlang B124/ B125/ Rampen S10
- Errichtung Stützobjekt entlang Lagerhaus

## **Bauphase 04 (ca. 11/2025 – 12/2025):**

- Herstellung Bodenmarkierungen
- Errichtung Verkehrsleiteinrichtungen
- Inbetriebnahme VLSA
- Restarbeiten



LAND  
OBERÖSTERREICH

A|S|F|i|N|A|G



# Endausbau





LAND  
OBERÖSTERREICH

ASFiNAG



Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit!
